Thiết kế Inspect and Adapt cho ShopCare AI

5.1. Kiểm tra Increment

Mã	Nội dung
SC - 61	80/80 kiểm thử đạt và không còn lỗi cao. Đạt điều kiện để đóng gói
SC - 65	42/42 kiểm thử đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt và đạt được tiêu chuẩn an toàn thông tin
SC - 62	70/78, còn tồn tại 8 lỗi dịch vụ đơn hàng
SC - 63	Đang còn tồn tại 1 lỗi nghiêm trọng cao
SC - 64	Đang chờ kiểm tra che số điện thoại

Cách xử lý và trình bày phần chưa Done tại Sprint Review

+ Hành động: Chuyển các phần việc chưa hoàn thành của SC - 62, SC - 63, SC - 64 đưa lại về Product Backlog để tái ưu tiên lại cho Sprint tiếp theo, tuyệt đối sẽ không được trình diễn mã nguồn hoặc các tính năng chưa hoàn thiện.

+ Cách trình bày: Dev sẽ báo cáo ngắn gọn, khách quan về thực trạng kỹ thuật.

Điểm sai ở Sprint Review cũ và tác động

+ PO công nhận tất cả các mã đều là “Done” và biến buổi Review thành buổi nghiệm thu.

+ **Tác động:** Phá vỡ tính minh bạch của Scrum, đưa các yêu cầu tiềm ẩn lỗi vào sản phẩm, gây rủi ro sập hệ thống khi vận hành thực tế.

+ PO Cam kết thực hiện ngay lập tức các Feedback mà không qua thẩm định.

+ Tác động: Gây quá tải cho cả đội ngũ phát triển, làm mất quyền tự chủ sắp xếp Backlog dựa trên giá trị của PO, có thể dẫn đến vỡ trận kế hoạch Sprint tiếp theo do các cam kết trước đó.

5.2. Thiết kế Sprint Review

Mục tiêu: Thanh tra phần Increment thực tế đã Done và thích ứng Product Backlog thông qua việc thu thập Feedback chất lượng từ các bên liên quan.

Khung chương trình: 60 phút

+ Mở đầu và công bố trạng thái (5 phút): SM sẽ điều phối tuyên bố lý do, PO công bố mục tiêu Sprint 14 và làm rõ các hạng mục thực sự đạt DoD.

+ Trình diễn Increment thực thế (20 phút): Developers trực tiếp thao tác trên môi trường kiểm thử để chứng minh các luồng tính năng hoạt động mượt mà.

+ Thảo luận và thu thập phản hồi (25 phút): Các bên liên quan sẽ trải nghiệm thử, đưa ra nhận xét, PO hoặc SM sẽ dẫn dắt thỏa luận bằng các câu hỏi mở.

+ Đánh giá tiến độ chung và kết thúc (10 phút): PO sẽ trình bày sơ lược về Product Backlog hiện tại và dự kiến những hướng đi tiếp theo.

Mã Feedback	Nguồn gốc phản hồi	Bằng chứng	Điểm cần làm rõ	Hướng xử lý và đề xuất
F-01	Khách hàng	Yêu cầu tự động hóa 90%	Ngưỡng 90% đo lường trên tổng số cuộc hội thoại hay loại khiếu nại cụ thể	PO đưa vào Backlog, phân tích trước khi chuyển thành User Story
F-02	Vận hành	Yêu cầu chuyển tiếp sớm cuộc gọi	Định nghĩa "Sớm" là bao nhiêu giây, là bao nhiêu lượt tương tác lỗi	Thiết kế kịch bản rơi tự động khi AI không phản hồi > 1 phút

			của AI	
F-03	Bảo mật	Còn hiển thị SĐT	Quy chuẩn hiển thị mặt nạ dữ liệu	Kết hợp phần việc còn thiếu của SC - 64, ưu tiên sửa ngay trong Sprint 15
F-04	CSKH	Thiếu lịch sử tương tác đa kênh	Cần hiển thị tối đa bao nhiêu phiên tương tác gần nhất của khách hàng	Thiết kế UI/UX tích hợp hiển thị dòng thời gian lịch sử
F-05	Đội ngũ kỹ thuật	Lệch chỉ số hiệu năng P95	Môi trường test có phản ánh đúng tải lượng người dùng thực tế không	Đưa vào hạng mục nghiên cứu kỹ thuật để tối ưu truy vấn hệ thống

5.3. Thiết kế Sprint Retrospective

Luồng 60 phút:

+ Set the Stage (05 phút): SM tái khẳng định Chỉ thị tối cao của Retrospective.

+ Gather Data (15 phút): Nhóm sẽ nhìn vào các số liệu thực tế, chỉ số an toàn tâm lý thấp; thay đổi quy tắc làm việc tùy tiện qua tin nhắn chắp vá; hoạt động Staging bắt đầu muộn và Integratiuon Test chậm trễ vào ngày thứ 8.

+ Generate Insights (15 phút): SM điều phối kỹ thuật Root Cause Analysis bằng phương pháp 5 Whys.

+ Decide Actions (20 phút): Nhóm cùng biểu quyết chốt phương án cải tiến, chọn ra tối đa 2 Action có tính khả thi và tác động cao nhất

+ Close & Follow-up (05 phút): Xác định rõ tiêu chí đo lường sự thành công của Action Items và kết thúc buổi họp.

Rà Action cũ:

Action 1: Chuẩn hóa kênh cập nhật quy tắc nghiệp vụ AI:

+ Hành động cụ thể: Ngừng thay đổi quy tắc phân loại qua tin nhắn cá nhân. Mọi thay đổi logic phân loại phải được PO cập nhật trực tiếp vào Ticket Jira và thông báo tập trung tại Daily Scrum.

+ Nhóm theo dõi và thực hiện: PO cập nhật, Developers và Tester thực hiện rà soát chéo.

+ Thời điểm hoàn thành: Áp dụng ngay từ ngày 1 của Sprint 15.

+ Bằng chứng hoàn thành: 100% thay đổi có log cập nhật trên công cụ quản trị dự án; không phát sinh tin nhắn thay đổi nghiệp vụ ngoài lồng.

Action 2: Đẩy sớm lịch trình tích hợp và kiểm thử:

+ Hành động cụ thể: Đẩy lịch Integration Test lên tối muộn Ngày 5 của Sprint thay vì Ngày 8 như trước để phát hiện sớm các lỗi dịch vụ đơn hàng và lỗi nghiêm trọng.

+ Nhóm theo dõi và thực hiện: Cả nhóm Scrum cùng tay, Tester chủ động thiết lập môi trường test tích hợp sớm.

+ Bằng chứng hoàn thành: Biên bản chạy test tích hợp tự động được xuất ra vào cuối ngày 5 với đầy đủ các chỉ số lỗi.

5.4. Chọn kỹ thuật Retro

Tiêu chí	**Phương án A: Start - Stop - Continue**	**Phương án B: Kỹ thuật 4Ls**
Mức độ an toàn tâm lý	Trung bình. Dễ gián tiếp biến thành nơi chỉ trích hành vi cá nhân	Cao. Hướng tới sự tập trung vào cảm xúc cá nhân khách quan đối với hệ thống thông qua các trục biểu đạt cụ thể
Tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ	Thấp. Tập trung trực tiếp vào hành động sửa ngọn hơn là đào sâu nguyên nhân tại sao sự việc xảy ra	Cao. Cột Lacked và Longed For thúc đẩy nhóm đào sâu bản chất vấn đề
Thúc đẩy hành động cụ thể	Rất cao. Định hướng trực tiếp bằng các động từ hành động rõ ràng	Khá. Cần một bước chuyển từ “Khao khát” sang “Hành động thực tế” thông qua điều


		phối của Scrum master
Thời lượng kiểm soát	Nhanh gọn, dễ gói gọn trong 45 - 60 phút	Cần đầu tư thời gian suy ngẫm sâu, kiểm soát tốt để tránh lan man
Hỗ trợ người ít nói	Khá dễ tương tác bằng cách viết các giấy note hành động nhanh	Rất tốt. Người ít nói dễ chia sẻ điều họ đã học được hoặc điều học thích một cách tự nhiên

Chọn 4Ls

+ **Trade-off:** 4Ls có thể tọa ra nhiều thảo luận mang tính cảm xúc hoặc mong muốn trừu tượng. Để khắc phục điều này, SM sẽ phải đóng vai trò bộ lọc, ép các khao khát này thành các tiêu chí Action Item cụ thể theo SMART ở 20 phút cuối

+ **Điều kiện đổi:** Nếu ở các Sprint sau, chỉ số an toàn tâm lý cải thiện vượt mức 4.0/5, nhóm sẽ chủ động quay lại hoặc kết hợp với Start - Stop - Continue để đẩy nhanh tốc độ chốt hành động cải tiến một cách trực diện nhất

5.5. Chu trình Inspect and Adapt

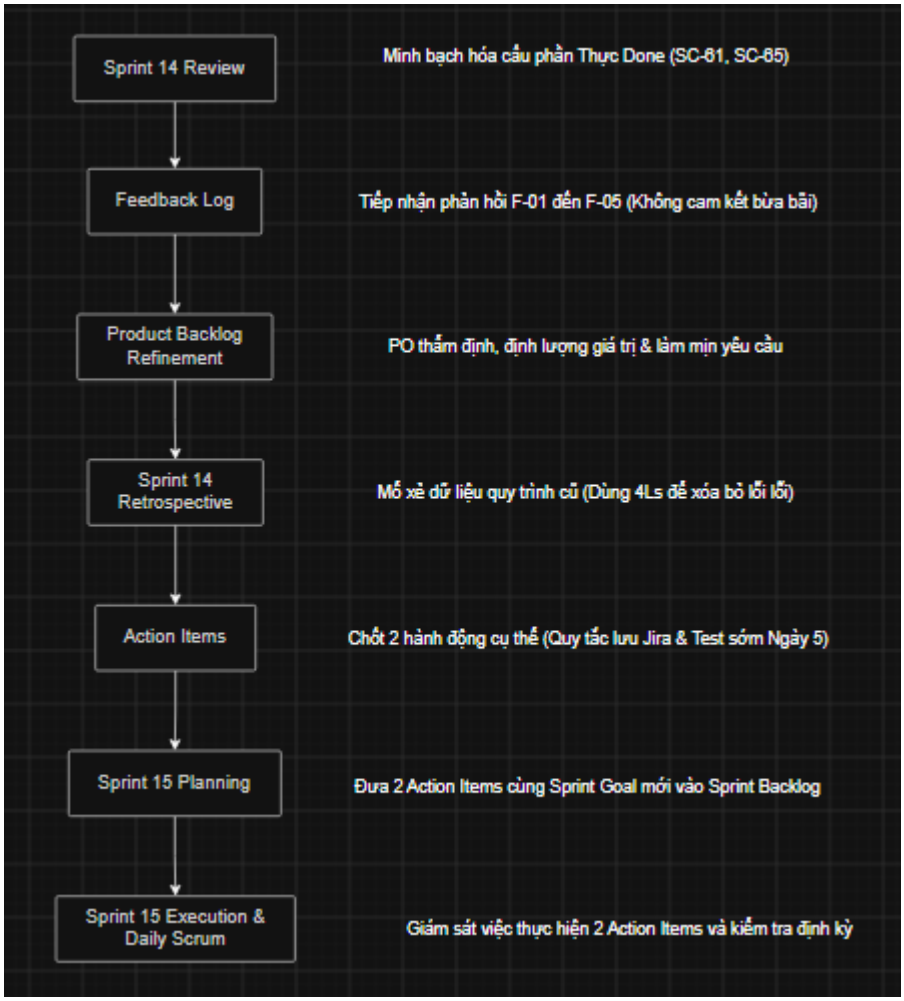

Hạng mục truy vết: F-04

+ Luồng đi: Xuất phát từ ý kiến của CSKH tại buổi Review Sprint 14 → PO ghi nhận vào Feedback Log → PO đưa vào Product Backlog và thực hiện phân tích nghiệp vụ, làm rõ dữ liệu đầu vào → Chuyển hóa thành User Story chuẩn chỉnh tại buổi Planning Sprint 15 để Dev kéo vào thực hiện phù hợp với mục tiêu Sprint Goal mới
+ Quyền cập nhật trạng thái: Product Owner.
+ Bằng chứng hoàn thành: User Story trên Jira chuyển sang trạng thái "Done" theo đúng định nghĩa Hoàn thành của Sprint 15.
+ Tiêu chí đo lường : Giao diện CSKH hiển thị đầy đủ tối thiểu 03 phiên tương tác gần nhất của cùng một khách hàng từ các kênh Chat/Email/Call trên một màn hình duy nhất mà không bị trễ quá 2 phút.

Hạng mục truy vết: Action 2

+ Luồng đi: Phát hiện nguyên nhân gốc rễ tại Retro Sprint 14 → Thống nhất chốt hành động cải tiến → Ghim trực tiếp Action Item này lên góc cao bảng công việc của Sprint 15 Hằng → ngày tại Daily Scrum, SM kiểm tra tiến độ thiết lập môi trường của nhóm.

+ Quyền cập nhật trạng thái: Scrum Master giám sát tổng thể, Đại diện Nhóm Phát triển thực hiện cập nhật.
+ Bằng chứng hoàn thành: Hệ thống CI/CD hoặc công cụ quản lý kiểm thử xuất ra bản báo cáo kết quả Integration Test tự động có đóng dấu thời gian trước 23:59 ngày thứ 5 của Sprint 15.
+ Tiêu chí đo lường: Số lượng ca lỗi nghiêm trọng được phát hiện và xử lý thành công trong nửa đầu Sprint tăng 50%, đảm bảo cuối Sprint 15 không còn tình trạng dồn ứ lỗi nghiêm trọng như cuối Sprint 14.
